

RELATÓRIO DE GERENCIAMENTO

Processo de Desenvolvimento de Software

Sistema Acadêmico — Team 3

Sprints 1 e 2 · Maio/Junho de 2026

Membros da Equipe

Arthur Barbosa · Artur Oliveira · Davi Roberto

Sprint 1

Período: 12 de maio de 2026 a 21 de maio de 2026

1.1 Organização da Equipe

A Sprint 1 foi conduzida sob a gestão de Davi Roberto Pereira Barbosa, responsável por coordenar as cerimônias ágeis (planning, daily e review), remover impedimentos e garantir que os itens do backlog fossem corretamente priorizados e distribuídos entre os membros da equipe.

A equipe foi composta por três integrantes com perfis de desenvolvimento full-stack, cada um responsável por um conjunto coeso de funcionalidades do sistema. A divisão foi orientada pela coesão funcional dos módulos, de forma a minimizar dependências e paralelizar o trabalho ao máximo.

Membro	Papel na Sprint	Responsabilidades
Davi Roberto Pereira Barbosa	Gerente de Sprint / Desenvolvedor	Coordenação da sprint; desenvolvimento do módulo de Cadastro de Usuários (modelagem, CRUD, persistência, interface e testes JUnit)
Arthur Barbosa	Desenvolvedor	Desenvolvimento completo do módulo de Autenticação de Usuários (login, sessão, tratamento de erros, interface e testes JUnit)
Artur Oliveira	Desenvolvedor	Desenvolvimento completo do módulo de Controle de Acesso (permissões por perfil, menus diferenciados, restrições e testes JUnit)

Dinâmica de Trabalho

As dailies foram realizadas de forma assíncrona, com atualizações registradas diretamente no Azure DevOps. O planejamento da sprint definiu as histórias de usuário (Issues) e o respectivo detalhamento em tasks, todas com responsável atribuído antes do início da execução. Ao final da sprint, a revisão confirmou que todos os 19 itens de trabalho foram concluídos com sucesso.

A comunicação entre os membros foi mantida de forma contínua, com integração via repositório compartilhado no GitHub e rastreabilidade completa de todas as tarefas no board do Azure DevOps.

1.2 Sprint Backlog

A Sprint 1 contemplou 3 histórias de usuário (Issues) e 16 tasks, totalizando 19 itens de trabalho. Todos os itens foram concluídos (estado Done) ao término da sprint. A tabela a seguir apresenta o backlog completo com seus respectivos identificadores.

Item de Trabalho (Issue)	Task / Atividade
Cadastro de Usuários	Modelagem e implementação do módulo de usuários

Item de Trabalho (Issue)	Task / Atividade
Cadastro de Usuários	Modelagem e implementação do módulo de usuários
Cadastro de Usuários	Implementação do cadastro de alunos, professores, coordenadores e administradores
Cadastro de Usuários	Implementação da busca e validação de usuários
Cadastro de Usuários	Implementação da persistência de usuários em arquivo
Cadastro de Usuários	Implementação da interface terminal de cadastro
Cadastro de Usuários	Criação de testes JUnit do módulo de usuários
Autenticação de Usuários	Modelagem e implementação do módulo de autenticação
Autenticação de Usuários	Implementação do login com matrícula/e-mail e senha
Autenticação de Usuários	Implementação do controle de sessão do usuário
Autenticação de Usuários	Implementação do tratamento de erros de autenticação
Autenticação de Usuários	Implementação de interface terminal de login
Autenticação de Usuários	Criação de testes JUnit do módulo de autenticação
Controle de Acesso	Implementação do controle de permissões por perfil
Controle de Acesso	Implementação de menus específicos para cada tipo de usuário
Controle de Acesso	Implementação das restrições de funcionalidades por perfil
Controle de Acesso	Criação de testes JUnit do controle de acesso

1.3 Análise do Gráfico de Burndown

O gráfico de Burndown da Sprint 1 (período de 12/05/2026 a 21/05/2026) registrou um escopo total de 112 pontos de trabalho, com burndown médio diário de 12 pontos, sem itens não estimados. Ao final da sprint, o trabalho restante foi zerado, confirmando a conclusão integral de todos os itens planejados.

Analisando o perfil da curva, observa-se que o trabalho permaneceu relativamente estável nos primeiros dias (12 a 18/05), com a maior parte das entregas concentrada entre os dias 18 e 19 de maio. Esse comportamento indica uma execução de modelo 'big batch', em que as integrações e conclusões ocorreram próximas ao final da sprint, em vez de distribuídas linearmente. Apesar disso, o resultado final foi satisfatório: a linha de 'Remaining' atingiu zero antes do prazo estabelecido pela Ideal Trend, demonstrando que a equipe entregou dentro do tempo previsto, com pequena antecipação no encerramento.

A ausência de escopo não estimado (Items not estimated: 0) e o escopo sem variação positiva (Total Scope Increase: 112, sem acréscimos) indicam um planejamento consistente e estável durante toda a sprint.

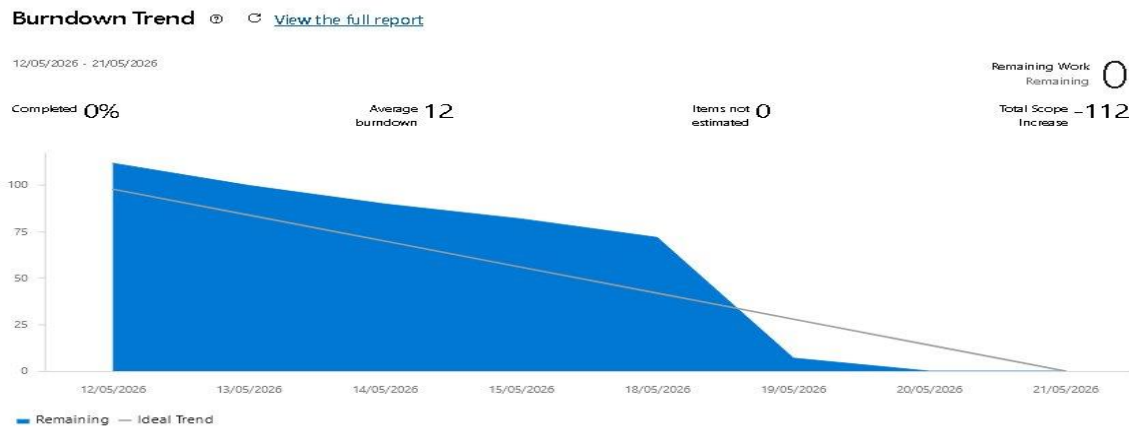


Figura 1 — Burndown Trend, Sprint 1 (12/05/2026 – 21/05/2026)

Sprint 2

Período: 22 de maio de 2026 a 01 de junho de 2026

2.1 Organização da Equipe

A Sprint 2 foi conduzida sob a gestão de Artur Oliveira, que assumiu o papel de Gerente de Sprint, substituindo Davi Roberto na função de coordenação. Essa rotação de papel é uma prática intencional da equipe para distribuir a experiência de liderança entre os membros, em conformidade com os princípios ágeis de times auto-organizáveis.

Nesta sprint, o volume de trabalho aumentou significativamente em termos de escopo de funcionalidades, cobrindo os módulos de Gestão de Cursos e Disciplinas, Gestão de Períodos Letivos, Oferta de Turmas e Documentação de Release. A distribuição das responsabilidades seguiu a especialização desenvolvida na Sprint 1, garantindo continuidade e aproveitamento do conhecimento adquirido.

Membro	Papel na Sprint	Responsabilidades
Artur Oliveira	Gerente de Sprint / Desenvolvedor	Coordenação da sprint; desenvolvimento completo do módulo de Gestão de Cursos e Disciplinas (modelagem, cadastro, persistência, interface e testes); supervisão da issue de Documentação Release
Arthur Barbosa	Desenvolvedor	Desenvolvimento completo do módulo de Gestão de Períodos Letivos (modelagem, cadastro, ativação/encerramento, persistência, interface e testes); documentação de cobertura de testes de usuários
Davi Roberto Pereira Barbosa	Desenvolvedor	Desenvolvimento completo do módulo de Oferta de Turmas (modelagem, oferta, edição, validações, persistência, interface e testes JUnit)

Dinâmica de Trabalho

A Sprint 2 manteve a estrutura ágil adotada na sprint anterior, com planejamento detalhado realizado antes do início da execução e acompanhamento contínuo via Azure DevOps. Todos os membros mantiveram autonomia sobre seus módulos, com pontos de sincronização para integração entre os componentes do sistema.

Dos 31 itens de trabalho planejados, 29 foram concluídos (estado Done). Dois itens da issue de Documentação Release permaneceram em estado To Do ao final da sprint — a task #1987 (documentação de cobertura de testes de turmas) e a task #1989 (README do repositório) —, indicando pendências de documentação que devem ser endereçadas em sprint subsequente ou como atividade de manutenção.

2.2 Sprint Backlog

A Sprint 2 contemplou 4 histórias de usuário (Issues) e 27 tasks, totalizando 31 itens de trabalho. A tabela a seguir apresenta o backlog completo com seus identificadores, issues e tarefas associadas.

Item de Trabalho (Issue)	Task / Atividade
Documentação Release	Realizar documentação sobre cobertura de testes de ofertas de turmas
Documentação Release	Documentação sobre a cobertura dos testes de validação de usuários
Documentação Release	Criar arquivo README do repositório no GitHub
Gestão de Cursos e Disciplinas	Modelagem e implementação do módulo de cursos
Gestão de Cursos e Disciplinas	Implementação do cadastro e listagem de cursos
Gestão de Cursos e Disciplinas	Implementação da persistência de cursos
Gestão de Cursos e Disciplinas	Modelagem e implementação do módulo de disciplinas
Gestão de Cursos e Disciplinas	Implementação do cadastro de disciplinas
Gestão de Cursos e Disciplinas	Implementação dos atributos acadêmicos e pré-requisitos das disciplinas
Gestão de Cursos e Disciplinas	Implementação da persistência de disciplinas
Gestão de Cursos e Disciplinas	Implementação da interface terminal de gestão acadêmica
Gestão de Cursos e Disciplinas	Criação de testes JUnit dos módulos de cursos e disciplinas
Gestão de Períodos Letivos	Modelagem e implementação de módulo de períodos letivos
Gestão de Períodos Letivos	Implementação do cadastro de períodos letivos
Gestão de Períodos Letivos	Implementação de ativação e encerramento de períodos
Gestão de Períodos Letivos	Implementação da persistência de períodos letivos
Gestão de Períodos Letivos	Implementação da interface terminal de períodos letivos
Gestão de Períodos Letivos	Criação de testes JUnit do módulo de períodos letivos
Oferta de Turmas	Modelagem e implementação do módulo de turmas
Oferta de Turmas	Implementação da oferta de turmas
Oferta de Turmas	Implementação da edição e cancelamento de turmas

Item de Trabalho (Issue)	Task / Atividade
Oferta de Turmas	Implementação dos dados da turma: professor responsável, limite de vagas, horário e sala
Oferta de Turmas	Implementação da validação de professor obrigatório
Oferta de Turmas	Implementação da verificação de conflitos de horário do professor
Oferta de Turmas	Implementação da persistência de turmas
Oferta de Turmas	Implementação da interface terminal de gestão de turmas
Oferta de Turmas	Criação de testes JUnit do módulo de turmas

2.3 Análise do Gráfico de Burndown

O gráfico de Burndown da Sprint 2 (período de 22/05/2026 a 01/06/2026) apresentou um escopo total de 63 pontos de trabalho e burndown médio diário de 6 pontos. Assim como na Sprint 1, não foram registrados itens não estimados (Items not estimated: 0) e não houve ampliação de escopo ao longo da sprint (Total Scope Increase: -63).

A curva de Remaining da Sprint 2 exibiu um comportamento mais linear e progressivo em comparação à Sprint 1, acompanhando de forma mais próxima a Ideal Trend ao longo de todo o período. Esse padrão evidencia uma evolução na maturidade da equipe: as entregas foram distribuídas de maneira mais equilibrada ao longo dos dias, reduzindo a concentração de work items no final da sprint.

A curva de Remaining convergiu para zero ao final do período, coincidindo praticamente com a linha da Ideal Trend no encerramento em 01/06/2026. Apesar de dois itens da issue de Documentação Release permanecerem em aberto, o gráfico registra trabalho restante próximo de zero, o que é consistente com o baixo peso relativo dessas tarefas em relação ao escopo total. De modo geral, o burndown da Sprint 2 reflete um ciclo mais cadenciado e previsível, indicando consolidação do ritmo de entrega da equipe.

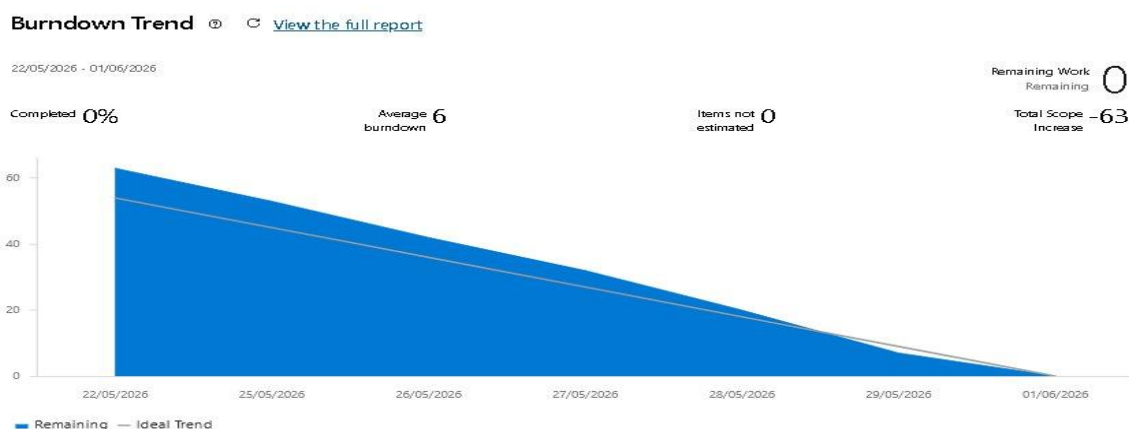


Figura 2 — Burndown Trend, Sprint 2 (22/05/2026 – 01/06/2026)

Nota de Organização - Release 1

Este relatório corresponde às Sprints 1 e 2. Os diagramas de matrícula, lista de espera e frequência foram adicionados aos documentos da Release 2, pois representam funcionalidades desenvolvidas nas Sprints 3 e 4. Assim, este PDF permanece focado no processo de gerenciamento da Release 1.
